

Resolução CN-SESI nº 0099/2022

Aprovar o Relatório de Monitoramento dos Projetos de Subvenções Extraordinárias - exercício 2022.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 208ª Reunião Ordinária de 27/7/2022, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando Ofício nº 062/2022- DIDEN- Comissão de Subvenções, de 22/6/2022, do presidente da Comissão de Subvenção Extraordinária e diretor do Departamento Nacional do Sesi, protocolado neste Conselho Nacional do Sesi, em 6/7/2022;

Considerando que o artigo 21, inciso VII, da Resolução CN-Sesi nº 0118/2021, de 29/11/2022, dispõe que a Comissão de Subvenção Extraordinária deve apresentar ao Conselho Nacional do Sesi, o Relatório de Monitoramento das Subvenções Extraordinárias – exercício 2022;

Considerando que as subvenções extraordinárias solicitadas pelos departamentos regionais se destinam a realização de projetos de natureza especial e temporária;

Considerando as boas práticas de gestão de projeto e as diretrizes da Resolução CN-Sesi nº 0118/2021, o Relatório encontra-se estruturado com os tópicos: Resumo dos projetos em execução; Rubricas/despesas previstas e realizadas; Projetos com alteração de objetivo geral; Relação dos projetos em execução; e Projetos encerrados;

Considerando que, conforme previsto no artigo 12 da Resolução CN-Sesi nº 0118/2021, o Departamento Nacional deu conhecimento à Comissão de Subvenção Extraordinária do monitoramento da execução física e financeira dos projetos vigentes nas reuniões realizadas em 25/2/2022 (ordinária) e 26/4/2022 (extraordinária);

Considerando que por se tratar do primeiro relatório, utilizou-se como escopo para análise os projetos vigentes até 31/5/2022; ✓



Cont. Resolução CN-SESI nº 0099/2022

Considerando os termos do parecer CONJUR N° 0117/2022, 22/7/2022, emitido pela da Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, no processo CN0159/2019.

RESOLVE

Art.1º Aprovar o Relatório de Monitoramento dos Projetos de Subvenções Extraordinárias – exercício 2022, com o resumo dos projetos em execução, as rubricas e despesas previstas e realizadas, os projetos com alteração de objetivo geral, os projetos em execução e os encerrados, parte integrante dessa Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 27 de julho de 2022.



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente



SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO- 2022

JUNHO

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao inciso VII do Art. 21 da Resolução do Conselho Nacional do SESI nº 0118/2021, a Comissão de Subvenção Extraordinária dá conhecimento ao Conselho Nacional do SESI do Relatório de Monitoramento das Subvenções Extraordinárias - 2022, documento organizado a partir dos projetos em execução pelos Departamentos Regionais classificados como deficitários.

Tendo por base boas práticas de gestão de projeto e as diretrizes da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, o Relatório encontra-se estruturado nos seguintes tópicos:


- Resumo dos projetos em execução;
- Rubricas/despesas previstas e realizadas;
- Projetos com alteração de objetivo geral;
- Relação dos projetos em execução; e
- Projetos encerrados.

Adicionalmente, informamos que, conforme previsto no Art. 12 da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, de 29 de novembro de 2021, o Departamento Nacional deu conhecimento à Comissão de Subvenção Extraordinária do monitoramento da execução física e financeira dos projetos vigentes nas reuniões realizadas em **25/02/2022** (ordinária) e **26/04/2022** (extraordinária).

Por fim, observamos que, por se tratar do primeiro relatório, utilizamos como escopo para análise os projetos vigentes até **31/05/2022**.

1. RESUMO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO

Fonte: SGF em 31/05/2022

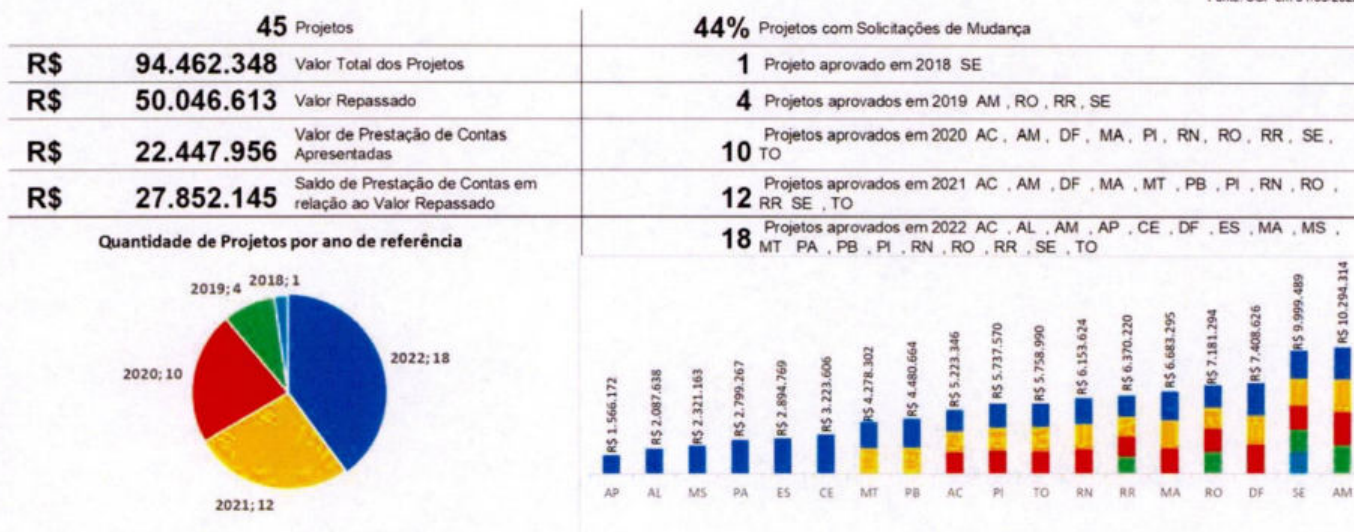

A leitura dos projetos em execução evidencia a aplicação dos recursos majoritariamente em reformas e melhoria física de unidades operacionais, além da substituição de máquinas e equipamentos, tendo como objetivo garantir segurança e qualidade de atendimento aos diversos públicos de interesse dos departamentos regionais. Em relação à vigência, evidencia-se que a maior parte dos projetos apresenta previsão de execução entre 12 e 24 meses, conforme apresentado no quadro abaixo:

Resumo das Ações em Execução:

Item	Parâmetro	Quantidade
Vigência	Entre 12 e 24 meses	29
	De 24 a 42 meses	16
	Total	45
Escopo	Atualização física e/ou tecnológica de unidades	37
	Reconstrução de unidades	4
	Expansão e construção de unidades	4
	Total	45

Fonte: Sistema de Gestão de Apoio Financeiro - SGF

2. RUBRICAS/ DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS

A análise dos projetos evidencia a intenção de os regionais alocarem os recursos subvencionados em bens imóveis, notadamente aquisição de terrenos, construções, instalações e benfeitorias, e em bens móveis (mobiliário, máquinas e equipamentos em geral e equipamento médicos, cirúrgicos, odontológicos, laboratoriais, de informática, mobiliário e veículos).

Resumo das Rubricas em Execução (R\$):

Item	Rubrica	Valor Previsto	Percentual	Valor Realizado	Percentual
Bens Imóveis	Construções em andamento	R\$ 45.657.028	48%	R\$ 15.265.222	47%
	Instalações	R\$ 2.970.544	3%	R\$ -	0%
	Prédios	R\$ 1.797.987	2%	R\$ 50.000	0%
	Terrenos	R\$ 1.785.963	2%	R\$ -	0%
	Total	R\$ 52.211.522	55%	R\$ 15.315.222	47%
Bens Móveis	Equipamentos de informática	R\$ 15.399.625	16%	R\$ 9.633.605	30%
	Máquinas e Equipamentos em Geral	R\$ 9.084.091	10%	R\$ 2.948.479	9%
	Mobiliário em geral	R\$ 7.849.486	8%	R\$ 1.689.365	5%
	Equip. Médicos, Cirúrgicos, odontológicos e Laboratoriais	R\$ 2.956.312	3%	R\$ 994.085	3%
	Veículos	R\$ 2.772.159	3%	R\$ 1.812.159	6%
	Outros	R\$ 103.190	0%	R\$ 53.190	0%
	Total	R\$ 38.164.863	40%	R\$ 17.130.883	53%
Outros	Manutenção e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 4.085.963	4%	R\$ 114.037	0%
Total Geral		R\$ 94.462.348	100%	R\$ 32.560.143	100%

Fonte: Sistema de Gestão de Apoio Financeiro - SGF

Nota: os percentuais referem-se ao total geral.

3. PROJETOS COM ALTERAÇÃO DE OBJETIVO GERAL

Em atendimento ao disposto no Art. 21 da Resolução CN-SESI nº 0118/202, a Comissão de Subvenção Extraordinária informa que, no período de **29/11/2021 a 31/05/2022**, não houve alteração de objetivo geral nos projetos subvencionados.

4. RELAÇÃO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO

Conforme disposto no inciso VII do Art. 21 da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, a Comissão de Subvenção Extraordinária, apresenta o extrato dos projetos em execução pelos regionais, emitido em 31/05/2022, contemplando os índices de desempenho físico e financeiro.

Fórmulas dos indicadores:

- i) Índice de desempenho físico (número de entregas realizadas dividido pelo número de entregas previstas); e
- ii) Índice de desempenho financeiro (Valor de prestações de contas realizadas dividido pelo valor de despesas previstas).

Relação de projetos em execução

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
AC	2020	31/08/2022	Melhorar as instalações da Escola SESI - Centro Educacional Marília Santana.	R\$ 1.720.100,00	R\$ 1.720.100,00	R\$ -	R\$ 1.005.243,33	R\$ 714.856,67	58%	100%
	2021	16/12/2022	Melhorar as instalações das Unidades de Educação e de Saúde e Segurança SESI AC.	R\$ 1.680.038,51	R\$ 300.000,00	R\$ 1.380.038,51	R\$ -	R\$ 300.000,00	0%	33%
	2022	15/12/2022	Atualizar a infraestrutura das instalações das Unidades de Educação e de Saúde e Segurança do SESI/AC e atualização da frota de veículo.	R\$ 1.823.207,72	R\$ -	R\$ 1.823.207,72	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
AM	2022	03/01/2023	Realizar aquisição de mobiliários.	R\$ 2.087.637,77	R\$ -	R\$ 2.087.637,77	R\$ -	R\$ -	0%	0%
	2019 ¹	29/07/2022	Investir nas Unidades de Negócios com vistas na ampliação da capacidade de atendimento das Unidades Operacionais.	R\$ 2.341.472,00	R\$ 2.341.472,00	R\$ -	R\$ 1.517.631,36	R\$ 823.840,64	65%	60%
	2020 ¹	30/06/2022	Investir nas Unidades de Negócios com vistas na ampliação da capacidade de atendimento das Unidades Operacionais.	R\$ 2.661.152,00	R\$ 2.661.152,00	R\$ -	R\$ 1.120.156,00	R\$ 1.540.996,00	42%	60%
	2021	31/07/2023	Construção da fase 1 do edifício garagem.	R\$ 2.659.449,81	R\$ 800.449,81	R\$ 1.859.000,00	R\$ -	R\$ 800.449,81	0%	0%
	2022	15/12/2022	Instalar sistema de energia solar fotovoltaica na unidade Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).	R\$ 2.632.239,93	R\$ 880.239,93	R\$ 1.752.000,00	R\$ -	R\$ 880.239,93	0%	0%

¹ Projeto em processo de replanejamento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
AP	2022	15/12/2022	Reformar e equipar as Unidades de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon (CAT-HCP) de Atendimentos e de SSI Integrada.	R\$ 1.566.171,95	R\$ -	R\$ 1.566.171,95	R\$ -	R\$ -	0%	17%
			Adequar a infraestrutura física e adquirir terreno, novos mobiliários e equipamentos em geral para as Escolas SESI.	R\$ 3.223.605,50	R\$ 2.014.590,05	R\$ 1.209.015,45	R\$ -	R\$ 2.014.590,05	0%	42%
DF	2020 ¹	31/03/2022	Adequar as unidades operacionais do SESI/DF.	R\$ 2.394.629,00	R\$ 2.394.629,00	R\$ -	R\$ 1.765.760,78	R\$ 628.868,22	74%	100%
			Promover adequações nas Unidades Operacionais do SESI Gama, Taguatinga, Guará e Sobradinho.	R\$ 2.335.573,26	R\$ 400.000,00	R\$ 1.935.573,26	R\$ 388.450,00	R\$ 11.550,00	17%	86%
	2022	28/02/2023	Realizar adequação das Unidades Operacionais de Educação e Saúde e Segurança na Indústria.	R\$ 2.678.423,46	R\$ 600.000,00	R\$ 2.078.423,46	R\$ -	R\$ 600.000,00	0%	0%
ES	2022	15/12/2022	Adquirir máquinas e equipamentos das unidades do SESI-DR/ES.	R\$ 2.894.768,66	R\$ -	R\$ 2.894.768,66	R\$ -	R\$ -	0%	33%

¹ Projeto em processo de replanejamento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
MA	2020	28/10/2022	Reformar um conjunto de edificações composto por duas Unidades Operacionais: Escola Anna Adelaide Bello. Reformar a Unidade Sesi de Segurança e Saúde.	R\$ 2.050.776,00	R\$ 1.188.506,00	R\$ 862.270,00	R\$ 1.224.224,96	R\$ -	60%	0%
	2021	30/11/2022	Realizar parte das adequações necessárias nas unidades operacionais do Sesi/MA.	R\$ 2.287.607,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.287.607,00	R\$ 1.217.768,71	R\$ -	53%	0%
	2022	29/04/2023	Reformar a infraestrutura física para as Unidades - Escola Anna Adelaide Bello e do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria.	R\$ 2.344.912,39	R\$ -	R\$ 2.344.912,39	R\$ -	R\$ -	0%	0%
MS	2022	20/12/2022	Executar reformas e adequações nos ambientes externos e internos das unidades e bibliotecas do Sesi MS.	R\$ 2.321.163,06	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.321.163,06	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	0%	55%

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
MT	2021 ²	31/05/2022	Atualizar os espaços físicos do Sesi Saúde Cuiabá (SESI SST) e Sesi Escola Cuiabá e o aparato tecnológico das Unidades Operacionais de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande e Departamento Regional do Sesi MT.	R\$ 2.069.038,00	R\$ 2.069.038,00	R\$ -	R\$ 689.679,33	R\$ 1.379.358,67	33%	100%
	2022	31/01/2023	Reformar a infraestrutura física do Sesi/MT e da Unidade operacional Sinop.	R\$ 2.209.264,12	R\$ 736.421,37	R\$ 1.472.842,75	-	R\$ 736.421,37	0%	0%
PA	2022	15/12/2022	Adquirir equipamentos de informática para as unidades do Sesi/PA.	R\$ 2.799.267,29	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.299.267,29	-	R\$ 1.500.000,00	0%	14%
PB	2021 ²	31/07/2022	Reformar a infraestrutura física nos Centros de atividades e escolas do Sesi - PB.	R\$ 2.152.418,00	R\$ 2.152.418,00	-	R\$ 1.093.600,52	R\$ 1.058.817,48	51%	88%
	2022	15/12/2022	Dar continuidade as adequações nas infraestruturas físicas das unidades de Educação Básica e das unidades Saúde e Segurança (SSI) do Sesi-PB.	R\$ 2.328.246,00	R\$ 1.164.123,00	R\$ 1.164.123,00	-	R\$ 1.164.123,00	0%	0%

² Projeto em processo de encerramento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
PI	2020 ²	30/10/2021	Atender as necessidades do SESI DR/PI, quanto à melhoria da infraestrutura física e tecnológica.	R\$ 1.887.603,00	R\$ 1.887.603,00	R\$ -	R\$ 1.887.603,00	R\$ -	100%	100%
	2021 ¹	31/01/2022	Promover a melhoria das instalações físicas e da infraestrutura tecnológica das Unidades Operacionais do SESI Piauí e da sua sede administrativa.	R\$ 1.862.249,65	R\$ 931.124,82	R\$ 931.124,83	R\$ -	R\$ 931.124,82	0%	46%
	2022	31/03/2023	Dotar a nova sede da Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho de mobiliários e equipamentos.	R\$ 1.987.716,91	R\$ -	R\$ 1.987.716,91	R\$ -	R\$ -	0%	0%
	2020	31/12/2022	Investir em estruturas físicas e tecnologias modernas, para melhor desenvolver suas linhas de negócios em Educação e Segurança e Saúde na Indústria.	R\$ 2.033.394,00	R\$ 2.033.394,00	R\$ -	R\$ 1.195.657,83	R\$ 837.736,17	59%	60%
RN	2021	31/12/2022	Investir em estrutura física, na construção da 1ª etapa de uma nova unidade clínica.	R\$ 2.014.244,98	R\$ 700.000,00	R\$ 1.314.244,98	R\$ -	R\$ 700.000,00	0%	0%
	2022	16/12/2022	Construir a 2ª etapa de uma nova unidade clínica para o melhor desenvolvimento de suas linhas de negócio de Segurança e Saúde no Trabalho.	R\$ 2.105.984,57	R\$ 700.000,00	R\$ 1.405.984,57	R\$ -	R\$ 700.000,00	0%	0%

² Projeto em processo de encerramento

¹ Projeto em processo de replanejamento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
RO	2019 ¹	31/05/2022	Modernizar as estruturas das Unidades Operacionais do SESI/RO.	R\$ 1.843.515,00	R\$ 1.843.515,00	R\$ -	R\$ 610.354,43	R\$ 1.233.160,57	33%	67%
	2020 ¹	30/06/2022	Modernizar as estruturas da Unidade SESI CAT Albano Franco em Porto Velho/RO.	R\$ 1.832.858,00	R\$ 1.832.858,00	R\$ -	R\$ 832.898,00	R\$ 999.960,00	45%	70%
	2021	31/08/2022	Promover maior conforto e segurança aos clientes internos e externos do SESI/DR RO.	R\$ 1.677.798,00	R\$ 1.677.798,00	R\$ -	R\$ 711.158,99	R\$ 966.639,01	42%	20%
	2022	31/12/2022	Promover a modernização de parte dos equipamentos de informática bem como, a substituição de 100% das Centrais de ar-condicionado da SEDE.	R\$ 1.827.122,77	R\$ 827.122,77	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 827.122,77	0%	20%

¹ Projeto em processo de replanejamento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
RR	2019 ²	30/06/2022	Garantir infraestrutura moderna e adequada para atender às demandas existentes nas empresas industriais.	R\$ 1.422.266,00	R\$ 1.422.266,00	R\$ -	R\$ 1.232.266,00	R\$ 190.000,00	87%	67%
	2020 ¹	30/06/2022	Manter infraestrutura em boas condições.	R\$ 1.598.796,00	R\$ 1.598.796,00	R\$ -	R\$ 1.272.074,95	R\$ 326.721,05	80%	60%
	2021	30/07/2022	O presente projeto tem por finalidade a manutenção da infraestrutura das instalações e modernização tecnológica das unidades do CET João de Mendonça Furtado, CAT Fernando Bezerra e CAT Waldir Peccini (Distrito Industrial).	R\$ 1.601.171,00	R\$ 1.051.171,00	R\$ 550.000,00	R\$ 429.727,82	R\$ 621.443,18	27%	33%
	2022	30/12/2022	Construir um espaço multiuso para promover serviços de Educação, Cultura e Promoção da Saúde.	R\$ 1.747.986,86	R\$ -	R\$ 1.747.986,86	R\$ -	R\$ -	0%	0%

² Projeto em processo de encerramento

¹ Projeto em processo de replanejamento

Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
SE	2018 ^z	30/06/2022	Ampliar a capacidade instalada da Unidade Centro Educacional Sesinho.	R\$ 1.817.172,00	R\$ 1.817.172,00	R\$ -	R\$ 1.544.640,82	R\$ 272.531,18	85%	100%
	2019 ^z	30/04/2022	Concluir a 2ª fase da Unidade Operacional Centro Educacional Sesinho - Bairro Industrial.	R\$ 1.797.046,00	R\$ 1.797.046,00	R\$ -	R\$ 1.544.705,00	R\$ 252.341,00	86%	38%
	2020 ^z	30/06/2022	Modernizar e aumentar a segurança dos serviços de TI no DR.	R\$ 1.932.269,28	R\$ 1.932.269,28	R\$ -	R\$ 430.473,30	R\$ 1.501.795,98	22%	50%
	2021	31/03/2023	Construção da 1ª fase da Unidade Operacional Centro Educacional Sesinho Bairro Industrial - acompanhada da capacidade de manutenção as instalações.	R\$ 2.147.517,80	R\$ 100.000,00	R\$ 2.047.517,80	R\$ 8.687,00	R\$ 91.313,00	0%	29%
	2022	15/12/2023	Construir a 2ª etapa da Unidade Operacional Centro de Educação Sesinho - Clube do Trabalhador.	R\$ 2.305.484,26	R\$ -	R\$ 2.305.484,26	R\$ -	R\$ -	0%	0%

^z Projeto em processo de encerramento


Departamento Regional	Ano de Aprovação	Vigência	Objetivo Geral	Valor do Projeto	Valor Total Repassado	Valor Total a Repassar	Valor Total de PC Acatadas	Saldo de Prestação de Contas em Relação ao Repasse	Índice de Desempenho Físico	Índice de Desempenho Financeiro
OI	2020	30/12/2022	Ampliar as estruturas físicas e tecnológicas das escolas da rede Sesi de educação no Tocantins.	R\$ 1.784.596,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 784.596,00	R\$ 107.238,21	R\$ 892.761,79	6%	0%
	2021	30/12/2022	Promover maior segurança e qualidade de suas instalações por meio de reformas estruturais e tecnológicas das unidades de Gurupi, Palmas, Escola Sesi Araguaína e Promoção da Saúde de Araguaína.	R\$ 2.003.056,46	R\$ 1.000.000,46	R\$ 1.003.056,00	R\$ 617.955,97	R\$ 382.044,49	31%	0%
	2022	15/12/2022	Modernizar a infraestrutura física e tecnológica das Unidades Operacionais de Palmas, Araguaína e Gurupi.	R\$ 1.971.337,85	R\$ 971.337,85	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 971.337,85	0%	0%

5. PROJETOS ENCERRADOS

5.1. HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS


Apresentamos o histórico de encerramentos em valores e quantidade de projetos, conforme gráficos abaixo:

Histórico de Encerramentos em Reais

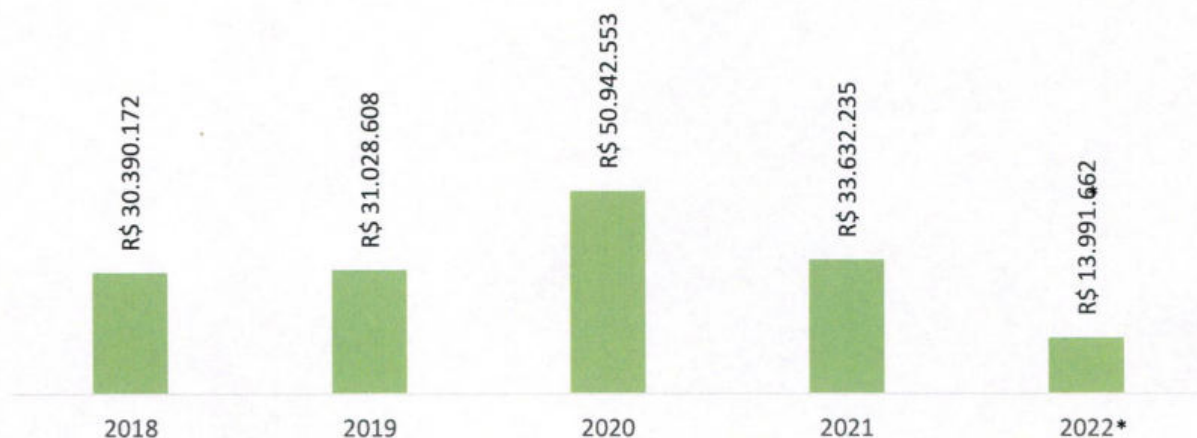

*Posição até 31/05/2022.

Histórico de Encerramentos em Quantidade

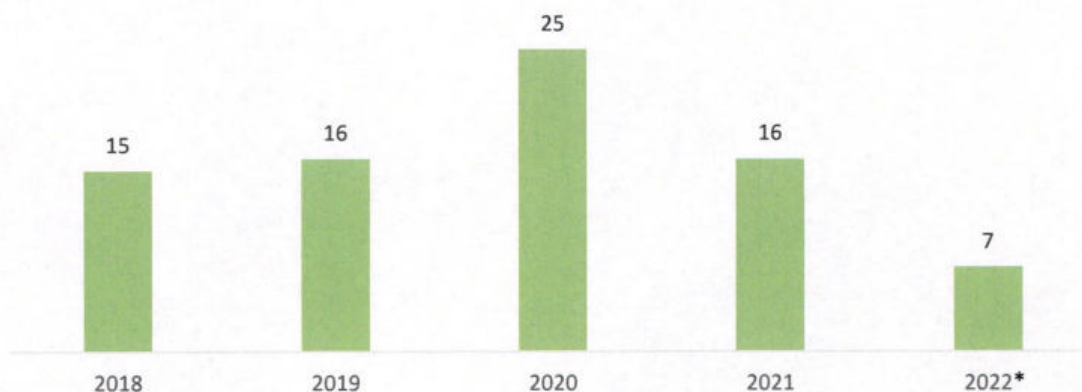

*Posição até 31/05/2022.

Nota: a quantidade de projetos encerrados em 2018, 2019, 2020 e 2021, são referentes a exercícios fechados (de janeiro a dezembro), já para 2022 o número refere-se ao período de janeiro a maio.

5.2. PROJETOS ENCERRADOS NO PERÍODO

Em atendimento ao disposto no inciso VII do Art. 21 da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, a Comissão de Subvenção Extraordinária apresenta a relação dos projetos encerrados no período de **29/11/2021 a 31/05/2022**.

Relação de projetos encerrados

DR	Ano de Aprovação	Objetivo	Data de Início	Data de Encerramento	Rubricas	Total
AL	2021	Tornar mais competitivos os serviços do SESI/AL, por meio da modernização do laboratório de robótica, melhorias na mobilidade dos serviços de SSI e da segurança e celeridade dos dados e informações que suportam os negócios e a tomada de decisão.	04/01/2021	26/04/2022	Equipamentos de informática Veículos Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 1.395.957 R\$ 434.397 R\$ 101.613
AL Total						R\$ 1.931.967
AP	2020	Readequar a infraestrutura das Unidades Operacionais do SESI, tendo vista ofertar ambientes compatíveis com as atividades oferecidas, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários	02/03/2020	25/01/2022	Bens Móveis	R\$ 1.123.872
					Bens Imóveis	R\$ 138.798
	2021	Concluir a segunda etapa da reforma da Unidade Operacional do SESI de Macapá (Centro de Atividades Homero Charles Platon - CAT/HCP), visando revitalizar as instalações do SESI para dispor aos clientes espaços condizentes ao desenvolvimento dos serviços oferecidos.	04/01/2021	08/03/2022	Construções em andamento	R\$ 1.265.579
AP Total						R\$ 2.528.250

DR	Ano de Aprovação	Objetivo	Data de Início	Data de Encerramento	Rubricas	Total
CE	2021	Adequar a infraestrutura física das Escolas das Unidades SESI, com vistas a ampliação da oferta dos serviços de Educação Básica Regular no estado do Ceará.	04/01/2021	06/04/2022	Instalações	R\$ 3.005.545
CE Total						R\$ 3.005.545
ES	2021	Otimizar as operações e o acesso às unidades, por meio da aquisição de veículos automotores; manutenção da infraestrutura mobiliária das salas de aula das unidades de educação básica e da manutenção do aparelhamento tecnológico dos laboratórios de informática.	04/01/2021	08/03/2022	Equipamentos de informática	R\$ 1.774.692
					Mobiliário em geral	R\$ 666.698
					Veículos	R\$ 218.250
ES Total						R\$ 2.659.640
MS	2021	Promover melhoria nas instalações e no atendimento aos usuários dos serviços do SESI/MS, por meio de reforma e modernizações dos espaços físicos na Unidade Campo Grande e nas bibliotecas, adequações no projeto de segurança contra incêndio e pânico na Escola SESI três Lagoas, a instalação do playground em Naviraí e aquisição de veículos para suportar aos negócios e aos clientes.	04/01/2021	10/01/2022	Construções em andamento	R\$ 1.294.005
					Veículos	R\$ 829.879
MS Total						R\$ 2.123.884

UF	Ano de Aprovação	Objetivo	Data de Início	Data de Encerramento	Rubricas	Total
MT	2020	Executar os serviços finais da obra de construção do Centro de Atendimento ao Trabalhador - CAT do Sesi em Rondonópolis-MT, objetivando ampliar os serviços de Qualidade de Vida e oferecer os atendimentos da Educação em um mesmo local, facilitando o acesso do trabalhador da indústria a vários serviços do Sesi, bem como atualizar o aparato tecnológico de uma Unidade Móvel multiuso do Sesi/MT, visando melhorar o atendimento às indústrias do estado.	01/01/2020	16/12/2021	Construções em andamento	R\$ 2.213.944
					Equipamentos de informática	R\$ 65.910
					R\$ 2.279.854	
PA	2021	Reestruturar o parque tecnológico das Unidades Operacionais, com vistas a garantir a modernização e qualidade de atendimento aos seus usuários - trabalhadores das indústrias e seus dependentes.	04/01/2021	06/12/2021	Equipamentos de informática	R\$ 2.607.919
PA Total						R\$ 2.607.919
PB	2020	Realizar reformas e melhorias nos Centros de Atendimento aos Trabalhadores CATs: Unidade APRIGIO VELOSO DA SILVEIRA-AVS na cidade de Campina Grande - PB; Unidade DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA- DMA na cidade de Patos- PB; Unidade JOSÉ DE PAIVA GADELHA -JPG na cidade de Sousa - PB.	02/01/2020	16/12/2021	AVS - Construções em andamento	R\$ 840.000
					DMA - Construções em andamento	R\$ 828.000
					JPG - Construções em andamento	R\$ 515.914
PB Total						R\$ 2.183.914

UF	Ano de Aprovação	Objetivo	Data de Início	Data de Encerramento	Rubricas	Total
TO	2019	Adequar as instalações, modernizar os equipamentos e mobiliários em geral nas áreas de Educação, Promoção da Saúde e Gestão, objetivando melhoria de nossos serviços, tanto para o atendimento realizado aos nossos clientes quanto ao ambiente de trabalho dos colaboradores.	01/07/2019	06/04/2022	Investimentos	R\$ 1.742.376
TO Total						R\$ 1.742.376
Total Geral						R\$ 21.063.349
